# H30 アクションプランシート　事業 No.9

## Ⅰ．事業の基礎情報

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | | 高浜小学校等整備事業 | | | | 担当部・グループ名 | | 教育委員会<br>学校経営グループ　他 | | | | |
| 総合計画（基本計画）体系 | 個別目標 | （2）将来を見据えた健全な財政運営を行います | | | | | | | | | | |
| | こんなことに取り組みます | 公共施設の再編や長寿命化に対する市民の理解を高めるとともに、順次、個別施設計画を策定し、公共施設総合管理計画の着実な推進につなげます。 | | | | | | | | | | |
| | みんなで目指すまちづくり指標名 | ― | | | | | | | | | | |
| | | 計画策定時の値 (2017) | ― | 実績値 (2018) | ― | 実績値 (2019) | ― | 実績値 (2020) | ― | 目標値 (2021) | ― | (単位) % |
| 総合戦略 | | □該当する　■該当しない | | | | 予算事業名 | | 高浜小学校等整備事業 | | | | |

## Ⅱ．目指す姿

| | |
|---|---|
| このアクションプランによって実現したい目指すべき市の姿 | ☆公共施設のあり方のモデルとなるよう、学校を核とした施設の複合化・集約化を進め、子どもから高齢者まで多様な住民が集う「地域コミュニティの拠点」として、地域ぐるみでまなび・文化・スポーツや子育ち・子育て等を支えていく環境を創出する。 |

## Ⅲ．これまでの成果・課題【CHECK】【ACTION】

| | | |
|---|---|---|
| これまでの取り組み（目指す姿実現のためにこれまで何をしてきたのか） | ◇教職員・保護者・利用者団体等への事業説明、意見交換を行った。 | |
| | ◇教職員・利用者団体等と設計に伴うワークショップを開催した。 | |
| | ◇基本設計、実施設計にかかる協議を事業者と行った。 | |
| | ◇スケジュールに基づき、工事に着手した。 | |
| | ◇小学校等整備に関する情報を、市広報及び公式ホームページに掲載した。 | |
| 成果（これまでの取り組みの成果） | 教職員・利用者団体等と何度も設計に伴うワークショップを行うことで、より使いやすい施設整備に向けた設計を進めることができた。 | |
| 課題（目指す姿実現に向け、これまでの取組みから見えてきた課題） | ① | 安全な工事進行に向けて、市関係グループ、事業者、学校等が工事の進捗や安全確保の確認など協議する場を随時、設ける必要がある。 |
| | ② | 校舎棟の建設後、必要な備品等の速やかな引越を行う必要がある。 |
| | ③ | 第１期供用開始に向け、学校との連携を含めた地域交流施設の運営方法や運営体制について、利用団体等を交えた協議を行う必要がある。 |

（様式第 1）

## Ⅳ．目指す姿の実現に向けた４年間の工程表・事業費概要【PLAN】

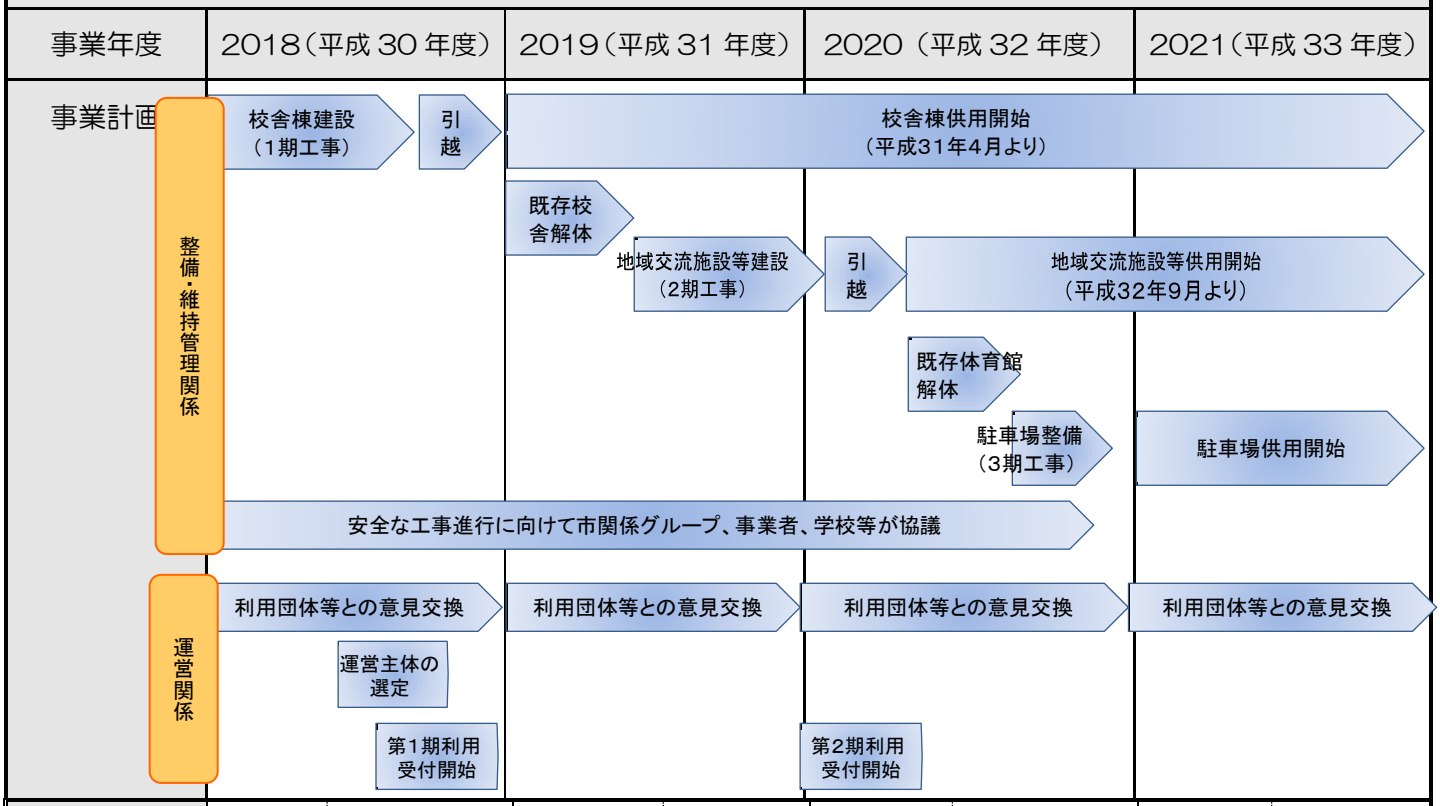


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業費総額(千円) | （当初） | 1,991,434 | （見込） | 31,256 | （見込） | 1,379,149 | （見込） | 154,427 |
| 財源内訳 一般財源 | | 166,461 | | 31,256 | | 1,300,377 | | 154,427 |
| 財源内訳 特定財源 | | 1,824,973 | | — | | 78,772 | | — |
| 特記事項 | | | | | | | | |

## Ⅴ．課題解決に向けた取組み【DO】　／　平成 30 年度事業費積算根拠

| 対応する課題 | | 課題の解決に向けて・・・　平成 30 年度に取組むこと　・　平成 33 年度までに取組むこと |
|---|---|---|
| ① | 平成 30 年度 | ◆校舎棟の建設工事を安全に行う。 |
| ② | 平成 30 年度 | ◆校舎棟の建設後、必要な備品等の速やかな引越を行う。 |
| ③ | 平成 30 年度 | ◆地域交流施設の利用ルール等について市民団体を交えた協議を行い、運営方法や運営体制を確立する。<br>◆公民館機能部分（集会室・和室など）について、利用受付を開始する。 |
| | 平成 31 年度 | ◇公民館機能部分（集会室・和室・ものづくり工房あかおにどん・IT 工房くりっくなど）について供用開始する。利用団体との意見交換を行い、運営改善に反映する。<br>◇メインアリーナ・サブアリーナ等の運営方法等について協議を行う。 |
| | 平成 32 年度 | ◇メインアリーナ・サブアリーナ・児童センター・駐車場（一部）を供用開始する。 |
| | 平成 33 年度 | ◇駐車場を供用開始する。（全施設供用開始） |
| 平成 30 年度（事業費の内訳） | | ・高浜小学校購入費　1,946,861 千円　　・通信運搬費　464 千円<br>・高浜小学校等整備事業建設・維持管理モニタリング業務委託料　11,027 千円<br>・高浜小学校引越業務委託料　5,206 千円　　など |
