H29 アクションプランシート　事業 No.15

①事業の基礎情報

事業名		高浜芳川緑地整備事業	担当部・グループ名		こども未来部 文化スポーツグループ
実施期間		平成 26 年度～平成 29 年度	担当 GL 氏名		鈴木　明美
新規・継続の別		**継続事業**	電話番号(内線)		52-1111(内線 300)
総合計画(基本計画)体系	個別目標	(3)人と学びの輪を広げ、まちのチカラを育みます	予算書上の予算・事業名	款	10款　教育費
				項	6項　保健体育費
	こんなことに取り組みます	誰もが楽しめるスポーツ・レクリエーションの機会をつくり、市民交流の場を充実します。		目	2目　生涯スポーツ費
				事業名	1　生涯スポーツ推進事業
			総合戦略		□該当する　■該当しない
	みんなで目指すまちづくり指標名	—			

現状値(H25)	—	実績値(H26)	—	実績値(H27)	—	実績値(H28)		目標値(H29)	—	(単位)

②事業の概要

PLAN	目　的 (何をどうするために)	★サッカーや野球などでの利用が可能な、多目的（スポーツ）広場の整備を図り、地域住民のスポーツやレクリエーション活動のニーズに対応するため。 ★地域行事等を通じて、文化交流や地域コミュニティの醸成を図ることのできる空間を整備するため。	
	対　象 (誰・何を対象に)	市民	対象の数量 47,661 人
	最終目標 (どのような状態を目指すのか最終的に何がどうなれば達成か)	☆前面に広大な水域景観が展開する水際空間において、多様な年齢層・利用者層に対応した日常的に気軽な利用を図ることのできる野外レクリエーション空間が整備されている。 ☆地域行事や催しを通じて、交流や地域コミュニティの醸成を図ることができる空間が整備されている。	
DO	平成 28 年度の取組み	目標の達成に向けて、何を・どのように・どうした（内容）	いつ
		①衣浦港務所と、県及び市実施工事の内容やスケジュールについて調整を行った。	H28.4～H29.3
		②上部利用についての検討会議を、関係団体を交えて行った。	H28.5～H29.3
		③昨年度開催した若者向けワークショップで出た意見・提案を上部利用検討会議メンバーで協議し、参加者へ協議結果をお返しした。	H28.5
		④供用開始に向け、市実施工事に着手した。	H28.12
CHECK	これまでの取組みから見えてきた課題・今後の取組みの方向性	◇スポーツ関連団体等からは、早期完成に向けて強い要望が寄せられている。県とこまめにキャッチボールし、地元意向をしっかりと伝え、事業の推進・調整を進めていく。 ◇一部暫定利用に向けて、「みんなの高浜芳川緑地」「簡易な維持管理は利用者自らが行う」という考え方のもと、利用のルール、維持管理方法等について、県と設計業者、ワークショップメンバー、管理運営団体と調整・協議を行う。 ◇整備内容や工事の経過、今後の活用等について、市民への情報発信を行う。	
備　考			

基本目標	Ⅱ　学び合い　力を合わせて　豊かな未来を育もう

③事業の工程表 ／ ④事業にかかる事業費概要

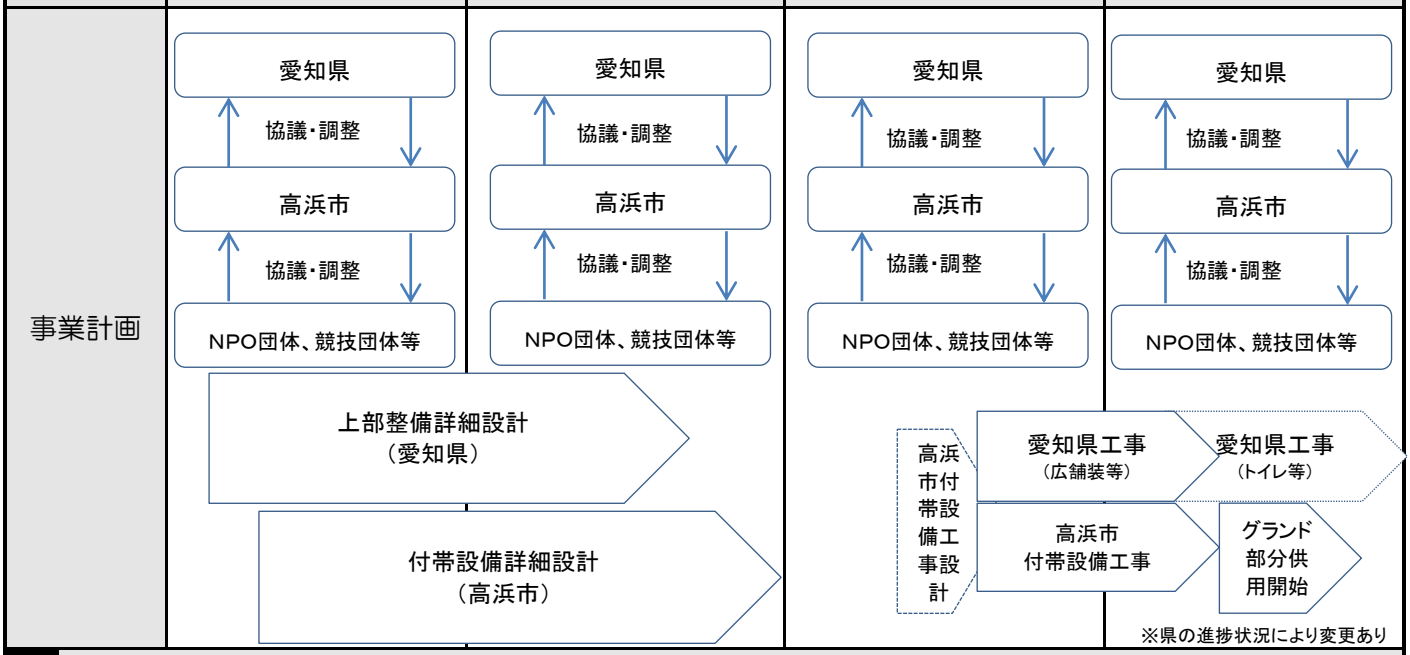

ACTION	平成 29 年度のアクション（平成 29 年度は何をするのか？）	
	いつまでに（期限）	課題の解決に向けて、何を・どのように・どうする（内容）
	随時	①今後の整備工事の具体的な実施計画について衣浦港務所との打合せを行う。
	H29.6	②運用に向けて、管理運営団体や中心となる利用者団体と協議を行う。
	H29.6	③県工事と調整しながら、供用開始に向けた付帯設備工事を進める。
	H29.7	④多目的広場の一部について、利用を開始する。オープニングイベントを開催する。
	随時	⑤高浜芳川緑地の整備進捗等について、市民へ情報を発信する。
	参画・協働・情報共有の工夫	★利用のルール・マナーなどを、町内会や関係団体等で構成する上部利用検討会議で協議するとともに、工事の進捗状況などについて随時発信し、情報共有に努める。
		★広報を行う際には、資料にイメージ図を活用する等、計画内容を分かりやすく伝える。

事業年度			平成 26 年度（実績）	平成27 年度(実績)	平成 28 年度（当初）	平成29年度(当初)
事業費総額(千円)			—	—	44,756	4,810
財源内訳	一般財源		—	—	14,756	4,298
	特定財源	国・県支出金	—	—	—	—
		その他	—	—	30,000	512
補助事業・単独事業の別			単独事業	単独事業	単独事業	単独事業

⑤事業にかかる事業費積算基礎

平成 29 年度	・光熱水費　194 千円 ・高浜芳川緑地多目的広場管理業務委託料　699 千円 ・高浜芳川緑地多目的広場備品購入費　2,642 千円 ・水道加入者分担金　1,275 千円
特記事項 （実施期間を通じて）	※H28 予算のうち、工事請負費と工事監理業務委託料は H29 へ繰越 繰越額⇒工事請負費 25,272 千円、工事監理業務委託料 3,165 千円 ※高浜芳川緑地アクセス道路整備工事費　23,000 千円【都市整備グループ計上】
